

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:35 horas**, del día **10 de agosto de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **24 de junio de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
- 2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 3 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
- 4 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
- 5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
- 6 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 7 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 8 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 9 Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.
- 10 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
- 11 Cinco Constructores, S.A. de C.V.
- 12 Estación 0+000 S.A. de C.V.
- 13 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
- 14 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
- 15 Adolfo Rodríguez Servín
- 16 Vicente López Gómez
- 17 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.
- 18 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
- 20 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
- 21 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
- 22 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. ✓
- 24 Construm, S.A. de C.V. ✓
- 25 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. ✓
- 26 Vohnung, S.A. de C.V. ✓
- 27 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. ✓
- 28 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ✓
- 29 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. ✓
- 30 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ✓

Con fecha del día **31 de julio de 2023**, a las **17:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín Casillas", con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 10                             |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| No. | Empresa y/o Persona Física                    | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.          | No se presentó | \$0.00          |
| 2   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.          | Se acepta      | \$5,235,119.59  |
| 3   | Maxwel Obras, S.A. de C.V.                    | Se acepta      | \$5,907,984.60  |
| 4   | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.       | No se presentó | \$0.00          |
| 5   | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. | No se presentó | \$0.00          |
| 6   | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.  | Se acepta      | \$5,787,852.97  |
| 7   | Constructora Nantli, S.A. de C.V.             | No se presentó | \$0.00          |
| 8   | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.             | No se presentó | \$0.00          |
| 9   | Sífral Ingeniería, S.A. de C.V.               | Se acepta      | \$6,090,685.76  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                      | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 10  | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.                           | No se presentó | \$0.00          |
| 11  | Cinco Constructores, S.A. de C.V.                               | No se presentó | \$0.00          |
| 12  | Estación 0+000 S.A. de C.V.                                     | Se acepta      | \$5,839,724.71  |
| 13  | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.                       | No se presentó | \$0.00          |
| 14  | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.                      | No se presentó | \$0.00          |
| 15  | Adolfo Rodríguez Servin                                         | No se presentó | \$0.00          |
| 16  | Vicente López Gómez                                             | No se presentó | \$0.00          |
| 17  | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.                   | Se acepta      | \$6,444,989.86  |
| 18  | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                             | No se presentó | \$0.00          |
| 19  | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.                          | No se presentó | \$0.00          |
| 20  | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.                             | Se acepta      | \$6,121,882.32  |
| 21  | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.                | No se presentó | \$0.00          |
| 22  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.                  | No se presentó | \$0.00          |
| 23  | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.                       | Se acepta      | \$5,259,223.59  |
| 24  | Construm, S.A. de C.V.                                          | No se presentó | \$0.00          |
| 25  | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.                          | Se acepta      | \$5,645,272.74  |
| 26  | Vohnung, S.A. de C.V.                                           | No se presentó | \$0.00          |
| 27  | Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 28  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$6,699,599.13  |
| 29  | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.                       | No se presentó | \$0.00          |
| 30  | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.                             | No se presentó | \$0.00          |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                                         | Importe con IVA  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ✓                            | \$5,235,119.59 ✓ |
| 2   | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. ✓                       | \$5,259,223.59 ✓ |
| 3   | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. ✓                          | \$5,645,272.74 ✓ |
| 4   | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. ✓                    | \$5,787,852.97 ✓ |
| 5   | Estación 0+000 S.A. de C.V. ✓                                     | \$5,839,724.71 ✓ |
| 6   | Maxwel Obras, S.A. de C.V. ✓                                      | \$5,907,984.60 ✓ |
| 7   | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. ✓                                 | \$6,090,685.76 ✓ |
| 8   | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ✓                             | \$6,121,882.32 ✓ |
| 9   | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. ✓                   | \$6,444,989.86 ✓ |
| 10  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ✓ | \$6,699,599.13 ✓ |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **31 de julio de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

**Previo a la evaluación binaria:**

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 2.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. | 3.- Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. | 4.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. | 5.- Estación 0+000 S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Gerencia en Construcción O&amp;R, S.A de C.V.</b> | <b>3.- Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.</b> | <b>5.- Estación 0+000 S.A. de C.V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 2.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. | 3.- Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. | 4.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. | 5.- Estación 0+000 S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Gerencia en Construcción O&amp;R, S.A de C.V.</b> | <b>3.- Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.</b> | <b>5.- Estación 0+000 S.A. de C.V.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CUMPLE</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>                                     | <b>CUMPLE</b>                                           | <b>CUMPLE</b>                          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Maxwel Obras,<br>S.A. de C.V. | 7.- Sifral<br>Ingeniería,<br>S.A. de C.V. | 8.- Lircon<br>Construcciones,<br>S.A. de C.V. | 9.- Construcción y<br>Supervisión Fica,<br>S.A. de C.V. | 10.- Constructora<br>e Inmobiliaria<br>Especializada<br>C.Villa,<br>S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que la firma plasmada en<br>los documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafo de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial<br>vigente con fotografía para<br>su cotejo... | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y<br>bases de licitación, anexos<br>técnicos – económicos,<br>modelo de contrato...                                                                                                                                 | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones<br>ambientales así como las<br>características referentes al<br>grado de dificultad de los<br>trabajos a desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de<br>los profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con<br>el propósito de poder<br>evaluarlo...                                                 | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.- Maxwel Obras,<br>S.A. de C.V. | 7.- Sifral<br>Ingeniería,<br>S.A. de C.V. | 8.- Lircon<br>Construcciones,<br>S.A. de C.V. | 9.- Construcción y<br>Supervisión Fica,<br>S.A. de C.V. | 10.- Constructora<br>e Inmobiliaria<br>Especializada<br>C.Villa,<br>S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que, por su conducto no<br>participan personas<br>inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de<br>la Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                          | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T7.-<br>Descripción de la<br>planeación integral<br>propuesta por el licitante<br>para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual<br>deberá ser congruente con<br>las características,<br>complejidad y magnitud de<br>los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                           | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>mano de obra dividido en<br>categorías propuesto por el<br>licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los<br>plazos determinados por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria y<br>bases de licitación...         | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.- Maxwell Obras,<br>S.A. de C.V. | 7.- Sifral<br>Ingeniería,<br>S.A. de C.V. | 8.- Lircon<br>Construcciones,<br>S.A. de C.V. | 9.- Construcción y<br>Supervisión Fica,<br>S.A. de C.V. | 10.- Constructora<br>e Inmobiliaria<br>Especializada<br>C.Villa,<br>S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>maquinaria y equipo de<br>construcción, propuesto<br>por el licitante, expresado<br>en horas de trabajo,<br>identificando su tipo y<br>características, conforme a<br>los plazos determinados<br>por la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y<br>volúmenes necesarios...                                                                                                                                         | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con<br>o sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                          | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.- Maxwel Obras,<br>S.A. de C.V. | 7.- Sifral<br>Ingeniería,<br>S.A. de C.V. | 8.- Lircon<br>Construcciones,<br>S.A. de C.V. | 9.- Construcción y<br>Supervisión Fica,<br>S.A. de C.V. | 10.- Constructora<br>e Inmobiliaria<br>Especializada<br>C.Villa,<br>S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para descontar de<br>las estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado<br>voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía<br>estimaciones SECIP con la<br>metodología para cargar<br>estimaciones, por lo que no<br>podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo.                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento<br>de obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a<br>la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por<br>el Servicio de<br>Administración Tributaria<br>(SAT) y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es<br>fidedigna en cuanto a su<br>contenido, en lo que en ella<br>se refleja y la misma no ha<br>sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes. | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                                                           |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUMPLE</b>                     | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                                           | <b>CUMPLE</b>                                                                    |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                            | \$5,235,119.59  |
| 2   | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.                       | \$5,259,223.59  |
| 3   | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.                          | \$5,645,272.74  |
| 4   | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.                    | \$5,787,852.97  |
| 5   | Estación 0+000 S.A. de C.V.                                     | \$5,839,724.71  |
| 6   | Maxwel Obras, S.A. de C.V.                                      | \$5,907,984.60  |
| 7   | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.                                 | \$6,090,685.76  |
| 8   | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$6,121,882.32  |
| 9   | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.                   | \$6,444,989.86  |
| 10  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | \$6,699,599.13  |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Maxwel Obras, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).*

**Incumplimiento:** Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en el **Documento E13** " Análisis de costo indirecto " presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administración de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra, de acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria y bases de licitación y su anexo económico respectivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento E11.-** Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos.

- A Análisis del factor tp/ti;
- B Tabla de cálculo del factor de salario real;
- C Análisis, cálculo e integración del salario real.

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerarse lo dispuesto en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

- a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA).
- b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello).*



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Incumplimiento:** Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** “Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética” se observa que en el **Documento E11.-** “Análisis detallado del factor de integración del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1.                                                                                                                                                                                          |                                               |                                 |                                 | \$6,116,000.00             |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: <b>15%</b></p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO \$4,513,034.13</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$5,556,025.74</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$4,992,046.28</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$5,740,853.22</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$4,243,239.34</p> |                                               |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EMPRESA                                       | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.          | \$4,513,034.13                  | \$5,235,119.59                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.     | \$4,533,813.44                  | \$5,259,223.59                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.        | \$4,866,614.43                  | \$5,645,272.74                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.  | \$4,989,528.42                  | \$5,787,852.97                  | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estación 0+000 S.A. de C.V.                   | \$5,034,245.44                  | \$5,839,724.71                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.               | \$5,250,591.17                  | \$6,090,685.76                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.           | \$5,277,484.76                  | \$6,121,882.32                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. | \$5,556,025.74                  | \$6,444,989.86                  | SE ACEPTA                  |

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$2,678,346.07                | \$3,319,850.40                | \$2,935,625.60      |
| 11. MANO DE OBRA        | \$808,061.33                  | \$1,068,281.21                | \$943,383.23        |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$173,790.44                  | \$319,890.63                  | \$245,846.00        |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$286,114.57                  | \$456,879.80                  | \$369,438.03        |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$0.00                        | \$9,462.41                    | \$1,721.12          |

| RUBROS                             | Codecam Construcciones, S.A.<br>de C.V. |                | Gerencia en Construcción O&R,<br>S.A de C.V. |                | Urbanizadora Construyías,<br>S.A. de C.V. |                | Arca Diseño y<br>Construcción, S.A.P.I. de<br>C.V. |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 71.6722%                                | \$2,708,493.70 | 70.2082%                                     | \$2,678,346.07 | 69.8764%                                  | \$2,845,638.41 | 68.3769%                                           | \$2,819,625.10 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 22.5517%                                | \$852,229.57   | 23.0527%                                     | \$879,427.17   | 23.8006%                                  | \$969,253.68   | 23.8656%                                           | \$984,133.32   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.7760%                                 | \$218,276.88   | 6.7391%                                      | \$257,087.72   | 6.3229%                                   | \$257,493.70   | 7.7575%                                            | \$319,890.63   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                               | \$3,779,000.15 | 100.0000%                                    | \$3,814,860.96 | 100.0000%                                 | \$4,072,385.79 | 100.0000%                                          | \$4,123,649.05 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 9.00000%                                | \$340,110.01   | 7.50000%                                     | \$286,114.57   | 7.68324%                                  | \$312,891.17   | 8.46383%                                           | \$349,018.65   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.01535%                                | \$632.30       | 0.00000%                                     | \$0.00         | 0.00000%                                  | \$0.00         | 0.00000%                                           | \$0.00         |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.00000%                                | \$370,776.82   | 10.00000%                                    | \$410,097.55   | 10.42000%                                 | \$456,945.86   | 11.00000%                                          | \$491,993.45   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59713%                                | \$22,514.84    | 0.59422%                                     | \$22,740.35    | 0.59751%                                  | \$24,391.61    | 0.60500%                                           | \$24,867.28    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                         | \$4,513,034.13 |                                              | \$4,533,813.44 |                                           | \$4,866,614.43 |                                                    | \$4,989,528.42 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Estación 0+000 S.A. de C.V. |                | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. |                | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. |                | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 71.2436%                    | \$2,915,943.89 | 71.6134%                        | \$3,085,870.06 | 76.2015%                            | \$3,319,850.40 | 70.8760%                                      | \$3,238,182.46 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 22.6208%                    | \$925,850.04   | 24.3534%                        | \$1,049,405.58 | 18.5477%                            | \$808,061.33   | 23.3821%                                      | \$1,068,281.21 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 6.1356%                     | \$251,124.34   | 4.0331%                         | \$173,790.44   | 5.2508%                             | \$228,758.97   | 5.7419%                                       | \$262,334.36   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                   | \$4,092,918.27 | 100.0000%                       | \$4,309,066.08 | 100.0000%                           | \$4,356,670.70 | 100.0000%                                     | \$4,568,798.03 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 10.10000%                   | \$413,384.75   | 10.00000%                       | \$430,906.61   | 8.50000%                            | \$370,317.01   | 10.00000%                                     | \$456,879.80   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.13560%                    | \$6,110.55     | 0.19963%                        | \$9,462.41     | 0.07582%                            | \$3,583.84     | 0.00000%                                      | \$0.00         |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 11.00751%                   | \$496,704.38   | 10.00000%                       | \$474,943.51   | 11.00000%                           | \$520,362.87   | 10.00000%                                     | \$502,567.78   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.61500%                    | \$25,127.50    | 0.60925%                        | \$26,212.57    | 0.60566%                            | \$26,550.34    | 0.60804%                                      | \$27,780.13    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                             | \$5,034,245.44 |                                 | \$5,250,591.17 |                                     | \$5,277,484.76 |                                               | \$5,556,025.74 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                                | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V. | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                               | \$227,131.90                         | \$257,279.53                               | \$89,987.19                            | \$116,000.50                                 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                             | \$91,153.66                          | \$63,956.06                                | \$0.00                                 | \$0.00                                       |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | \$27,569.11                          | \$0.00                                     | \$0.00                                 | \$0.00                                       |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                        | \$29,328.02                          | \$83,323.46                                | \$56,546.86                            | \$20,419.39                                  |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                           | \$1,088.81                           | \$1,721.12                                 | \$1,721.12                             | \$1,721.12                                   |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:<br>15+16+17+18+19                            | \$376,271.51                         | \$406,280.17                               | \$148,255.17                           | \$138,141.01                                 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:<br>UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$5,494.68                          | \$3,817.39                                 | \$308,690.69                           | \$353,852.44                                 |
| 22. CALIFICACIÓN                                                      | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA           | SOLVENTE                                   | SOLVENTE                               | SOLVENTE                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                                             | Estación 0+000 S.A. de C.V. | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$19,681.71                 | \$0.00                          | \$0.00                              | \$0.00                                        |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$17,533.19                 | \$0.00                          | \$135,321.90                        | \$0.00                                        |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                      | \$72,055.56                     | \$17,087.03                         | \$0.00                                        |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                      | \$0.00                          | \$0.00                              | \$0.00                                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                      | \$0.00                          | \$0.00                              | \$1,721.12                                    |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$37,214.90                 | \$72,055.56                     | \$152,408.92                        | \$1,721.12                                    |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$459,489.48                | \$402,887.95                    | \$367,953.95                        | \$500,846.67                                  |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                    | SOLVENTE                        | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                      |

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                       | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.          | \$4,513,034.13          | \$5,235,119.59                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                                        |
| 2   | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.     | \$4,533,813.44          | \$5,259,223.59                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 3   | Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V.        | \$4,866,614.43          | \$5,645,272.74                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 4   | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.  | \$4,989,528.42          | \$5,787,852.97                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 5   | Estación 0+000 S.A. de C.V.                   | \$5,034,245.44          | \$5,839,724.71                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 6   | Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.               | \$5,250,591.17          | \$6,090,685.76                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 7   | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.           | \$5,277,484.76          | \$6,121,882.32                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 8   | Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. | \$5,556,025.74          | \$6,444,989.86                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1.**, por un monto de **\$5,259,223.59 (cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés pesos 59/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,577,767.08 (un millón quinientos setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 08/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **11 de agosto de 2023 a las 17:35 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **12 de agosto de 2023** y de terminación el día **09 de diciembre de 2023**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **17:38 horas** del día **10 de agosto de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Edgar Gabriel Ruiz López  
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ✓                            |                        |
| Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. ✓                       |                        |
| Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. ✓                          |                        |
| Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. ✓                    |                        |
| Estación 0+000 S.A. de C.V. ✓                                     |                        |
| Maxwel Obras, S.A. de C.V. ✓                                      |                        |
| Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. ✓                                 |                        |
| Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ✓                             |                        |
| Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. ✓                   |                        |
| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ✓ |                        |

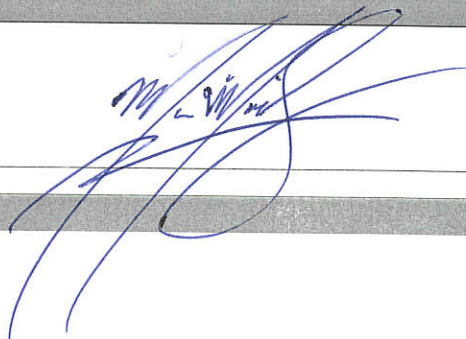
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Joel Vázquez Gutiérrez                              |   |
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |                                                                                     |
| Arq. Moisés Manríquez Ortega                             |  |
| TESTIGO SOCIAL                                           |                                                                                     |
|                                                          |                                                                                     |

